

施工进度报告

月度报告 2024 年 03 月

建筑商 LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

当前进程

工程概述

1. 拆除临时钢结构
2. 为外墙建造圈梁
3. 加强窗户框架

工程照片












3 月，在完成 1 楼和 2 楼的钢结构安装和面板铺设后，施工团队开始拆除临时钢结构，但主立面的部分除外，这些部分被保留以继续支撑外墙。

随后，我们开始为内墙结构放置底部钢材，以测试隔墙布局。这一步是为了确保符合基于实地测量的改进结构和设计计划。





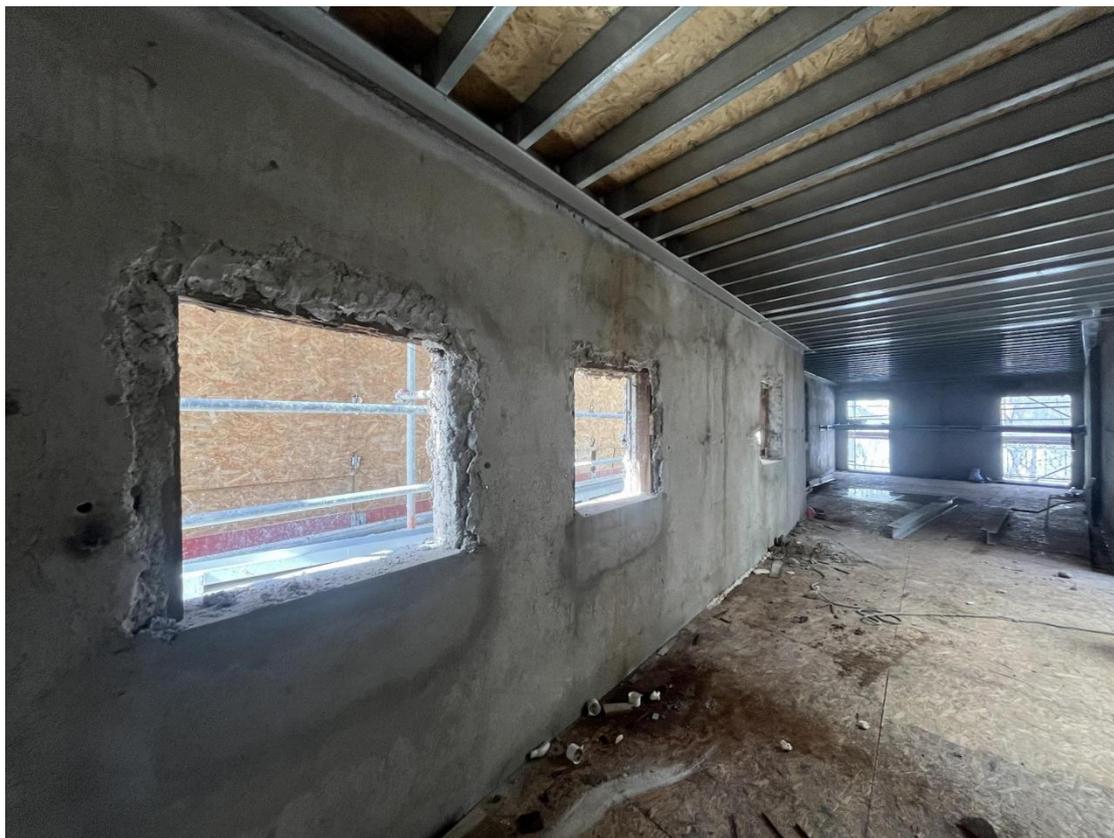



正如之前的报告所强调的，我们的 FGI 项目经理和工程师一直在积极优先考虑这座老旧建筑的结构完整性和稳定性。为了预防任何潜在的墙体倒塌并保护外墙，要求在顶层建造一道圈梁来加固外墙。

此外，建筑工人还加固了窗户框架，将木制框架替换为加固钢筋，并用混凝土填充以增加强度，并仔细重新调整窗户的形状。
