

施工進度報告

月度報告

2024 年 03 月

建築商


NS Reformas, Construccion Y Trading S.L.U

當前進程

工程概述

1. 開始粉刷
2. 鋅制屋頂和外牆板
3. 窗戶框架

工程照片

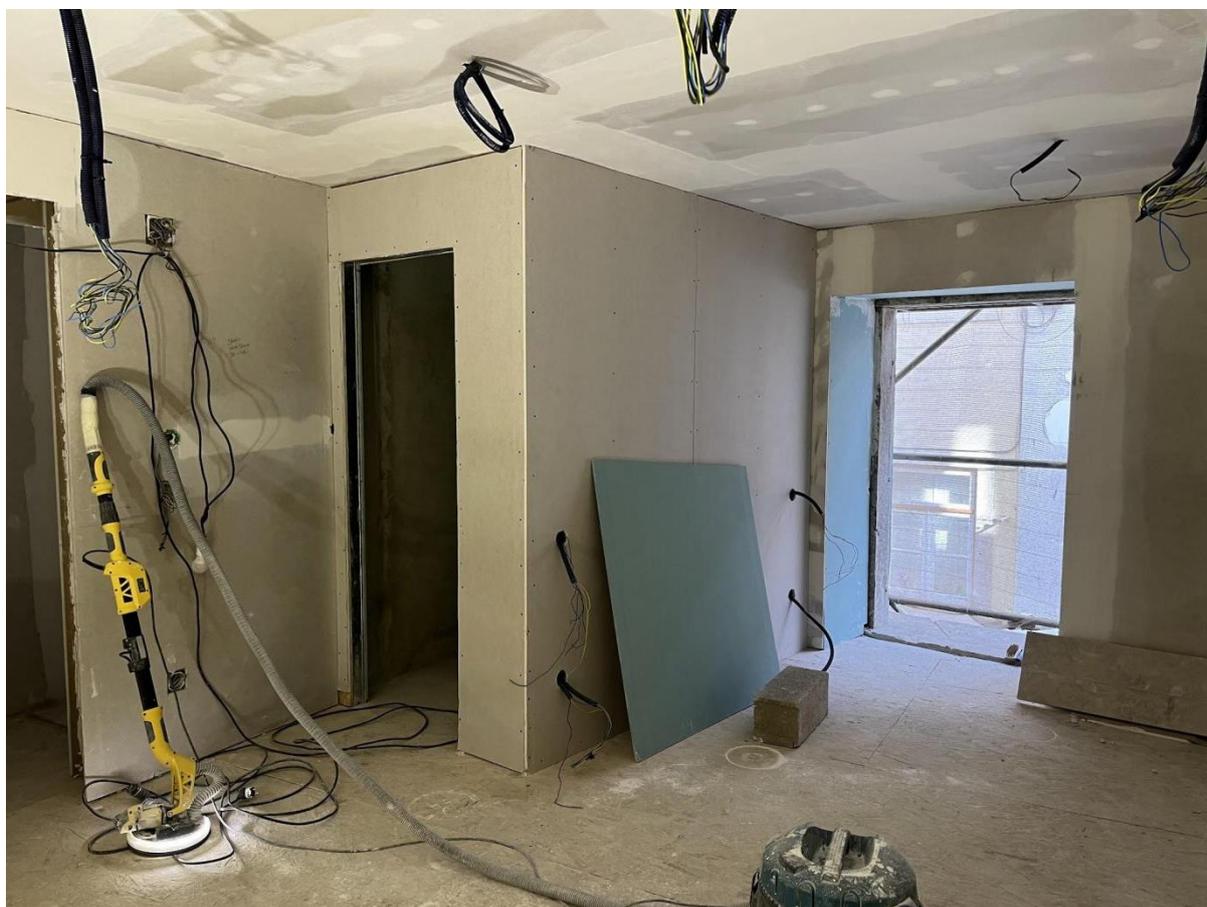









繼石膏板安裝之後，建築工人勤奮地對 1 樓、2 樓和 3 樓的牆壁和天花板接縫進行了處理和填充。經過這一細緻的過程後，他們開始將牆壁和天花板塗成白色。









與此同時，建築團隊根據裝修設計規範開始進行鋅制屋頂和外牆板的工作。此外，我們在 3 月份開始為各個部分的所有窗戶和門安裝石材窗臺。值得注意的是，窗戶是在工廠車間生產和預裝的。
